

প্রকল্পের নাম : প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান/গম সংগ্রহ করা।

প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	: ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ
খাদ্য অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পত্রালাপ	: ২৮/১২/২০১৪ খ্রিঃ
উপজেলা পরিষদের সভায় আলোচনা	: ৩০/১২/২০১৪ খ্রিঃ
খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন	: ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ
প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের মঞ্জুরীর আবেদন	: ২০/০৪/২০১৫ খ্রিঃ
অর্থ বরাদ্দের প্রশাসনিক মঞ্জুরী	: ০৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ
প্রতিষ্ঠানিক খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি	: ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ৩১/০৮/২০১৫ খ্রিঃ


(ক) বাস্তবায়নকারী টিম:

	টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য- ৪
নাম	মোঃ মনিরুল হক	আব্দুল্লাহ আল মামুন	রেখা রানী দে	মোঃ জাকির হোসেন	গাজী মোঃ এরফান উদ্দিন
পদবি	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অঃদাঃ)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	খাদ্য পরিদশক	সহকারী উপ খাদ্য পরিদশক	অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
দপ্তর	কলাপাড়া	খেপুপাড়া এলএসডি, কলাপাড়া	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রন দপ্তর	খেপুপাড়া এলএসডি, কলাপাড়া	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পটুয়াখালী সদর
ঠিকানা	পটুয়াখালী।	পটুয়াখালী	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী।
মোবাইল	০১৭৪০৬১০০০৯	০১৭৩৩১৬৭১১৮	০১৭৪৫৬৭৬৪০৩	০১৭৩৩১৬৭১১৮	০১৭২৪৯৯৬৬৩১

(খ) চিহ্নিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সেবা প্রহিতা বা জনগণের ভোগান্তি
মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাখ্যে প্রকৃত কৃষক ধান/গম সরকারের নিকট বিক্রয় করতে পারে না এবং ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।	ধান/গমের সংগ্রহ মৌসুম শুরু হবার পর কৃষক তালিকা করলে মধ্যসত্ত্বভোগীরা কৃষক তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।	স্থানীয় প্রভাবশালী/মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাখ্যে প্রকৃত কৃষক উৎপাদিত ধান/গমের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।
সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: প্রতি সংগ্রহ মৌসুমে চেয়ারম্যান/উপ-সহকারী কর্মকর্তার নিকট হতে পরিচিতি পত্র সংগ্রহ করতে সময়ক্ষেপন ও দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান ব্যয়। যেমনঃ কৃষক যখন চেয়ারম্যান/উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার কাছে পরিচিতি পত্র সংগ্রহ করতে যায় তখন কৃষকের সময় অপচয় ও কাজের বিঘ্ন ঘটে এবং যাতায়াত খরচ হয়। তাদের যথাসময়ে উপস্থিত না পেলে একজন কৃষককে বারবার তাদের কাছে যেতে হয়।		

(গ) সমাধান প্রক্রিয়া (Flow Chart)

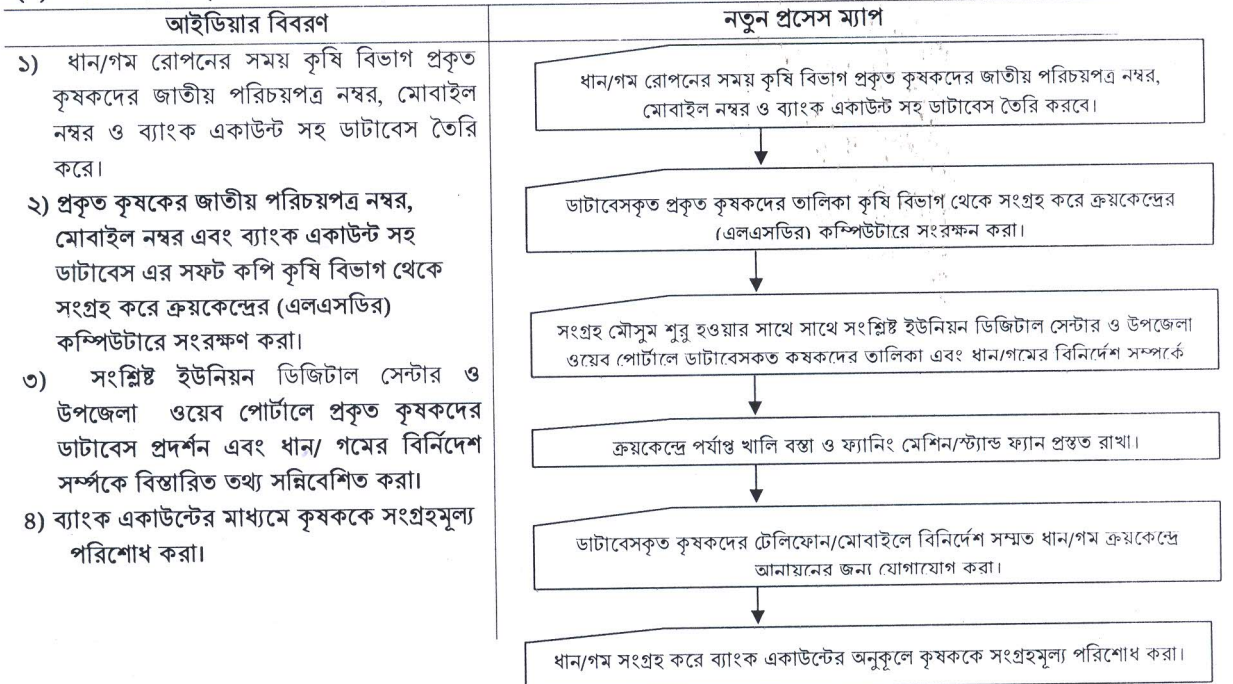

(Handwritten signature)

(ঘ) আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম:

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে?	Time (মাস ভিত্তিক)									
			জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট		
অবহিতকরন ও প্রস্তুতি	কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরন	ইউসিএফ										
	কমকর্তা/কমচারীদের উদ্ভুদ্ধকরণ	ইউসিএফ										
	উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় আলোচনা	ইউসিএফ										
	কৃষকদের সাথে মতবিনিময়	ইউসিএফ+টিম মেম্বার										
প্রকৃত কৃষকের ডাটাবেস ক্রয় কেন্দ্রে সংরক্ষন	ধান রোপনের সময় কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকৃত কৃষকদের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ব্যাংক একাউন্ট সহ ডাটাবেস প্রস্তুত করন	কৃষি বিভাগ										
	প্রকৃত কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক একাউন্ট সহ ডাটাবেসের সফট কপি কৃষি বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে ক্রয়কেন্দ্রের কম্পিউটারে স সংরক্ষণ করন।	ইউসিএফ+টিম মেম্বার										
সংগ্রহ মৌসুমে প্রচার/প্রচারনা	সংগ্রহ মৌসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে ডাটাবেসকৃত কৃষকদের তালিকা এবং ধানের বিনির্দেশ সম্পর্কে তথ্য প্রদান।	ইউসিএফ+টিম মেম্বার										
ধান/গম সংগ্রহ করে মূল্য পরিশোধ	ক্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত খালি বস্তা ও ফ্যানিং মেশিন/স্ট্যান্ড ফ্যান প্রস্তুত রাখা।	ইউসিএফ+টিম মেম্বার										
	ডাটাবেসকৃত কৃষকদের টেলিফোন/মোবাইলে বিনির্দেশ সম্মত ধান ক্রয়কেন্দ্রে আনায়নের জন্য যোগাযোগ করা।	ইউসিএফ+টিম মেম্বার										
	ধান সংগ্রহ করে ব্যাংক একাউন্টের অনুকূলে কৃষককে সংগ্রহ মূল্য পরিশোধ করা।	ইউসিএফ+টিম মেম্বার										

পাইলট প্রকল্পে ১৫০ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় করা হয়। তারমধ্যে ৫১ জন কৃষকের নিকট থেকে ৫১.০০০ মে.টন ধান সংগ্রহ করা হয়। কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

(ঙ) প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৫-৬ দিন	১০০০-১৫০০ টাকা	৫-৬ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ দিন	নাই	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	অতিরিক্ত সময় নষ্ট হবে না	অতিরিক্ত খরচ হবে না।	৪-৫ বার কমবে

অন্যান্য সুবিধাঃ কৃষক ন্যায্যমূল্য পেয়ে কৃষিকাজে উদ্ভুদ্ধ হবে এবং দেশ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূন হয়ে বিদেশে রপ্তানী করবে। সরকার ও খাদ্য বিভাগের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে।

(চ) রিসোর্স ম্যাপঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া গেছে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	বিদ্যমান জনবল	-	-
বস্তুগত	কম্পিউটার, ফ্যানিং মেশিন ও স্ট্যান্ড ফ্যান	৫০০০০/-	খাদ্য অধিদপ্তর, টাকা
অন্যান্য	-	-	-
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৫০০০০/-	-

(Handwritten signature)

১২৬৭

(ছ) প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের ঝুঁকি / চ্যালেঞ্জ ছিল ও কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:


অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ	কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে
স্থানীয় প্রভাবশালী/মধ্যসত্ত্বভোগীদের অবৈধ প্রভাব বিস্তার	Motivation work করে

(জ) টেকসইকরণ: প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হবে যদি মন্ত্রনালয়/অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খাদ্য মন্ত্রনালয়ের ২৭/০৮/২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত আগস্ট/২০১৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পাইলট প্রকল্পটি সারা দেশে Replicate করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঝ) প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা কর্মস্থলে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য। কেননা পর্যাপ্ত সময় দেয়া সম্ভব নয়।
২. আন্তঃবিভাগীয় সংস্থার সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। যেমনঃ এ প্রকল্পের সহিত উপজেলা প্রশাসন, কৃষি বিভাগ, হিসাবরক্ষন অফিস, ব্যাংক, খাদ্য বিভাগ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার জড়িত। জেলা প্রশাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।
৩. প্রকল্প গ্রহণকারী Department এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যাপক আন্তরিকতা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পর্যায়ে Orientation course করতে পারেন।
৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় পর্যাপ্ত দক্ষ লোকবল পদায়ন ও চাহিদাকৃত সরঞ্জামাদির জন্য পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ করা প্রয়োজন।
৫. কর্মকর্তাদের বদলী জনিত কারণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সমস্যা।

(ঞ) বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার নিরিখে অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ নীতিমালার ক্রমিক নং ৯ এর ক ও খ এ ডাটাবেসভুক্ত প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ করা হবে মর্মে নির্দেশনা জারী করা প্রয়োজন।


১০/১০/১৫
মোঃ মনিরুল হক
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অঃ দাঃ)
কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
